| ID | Nome da tarefa | Duração | Início | Conclusão Agendada | % Concluída | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **REFORMAS GERAIS** | **151 dias** | **Ter 02/01/18** | **Ter 31/07/18** | **100%** | |
| 2 | Transferência da banca de jornal/Bradesco | **84 dias** | **Ter 20/02/18** | **Sex 15/06/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 3 | Ref. Mobiliário carteado | **65 dias** | **Seg 26/02/18** | **Sex 25/05/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 4 | Ref. Vestiário masculino social - fases 02, 03 e 04 | **62 dias** | **Qui 01/03/18** | **Sex 25/05/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 5 | Interligação ramal de esgoto das saunas para estação de efluentes | **55 dias** | **Seg 12/03/18** | **Sex 25/05/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 6 | Eliminação de Infiltração Por capilarização | **35 dias** | **Seg 02/04/18** | **Sex 18/05/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 7 | Guarda corpo de vidro Portaria social | **21 dias** | **Seg 02/04/18** | **Seg 30/04/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 8 | Ref. Qds tênis 07,08,09,10,11,14 e 15 | **87 dias** | **Seg 02/04/18** | **Ter 31/07/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 9 | Adequação do Layout Centro médico | **31 dias** | **Seg 09/04/18** | **Seg 21/05/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 10 | Reforma da sala de preparação física | **35 dias** | **Seg 14/05/18** | **Sex 29/06/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 11 | Reforma do Chafariz Portaria Social | **25 dias** | **Seg 14/05/18** | **Sex 15/06/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 12 | Reforma Refeitorio | **22 dias** | **Seg 02/07/18** | **Ter 31/07/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 13 | Manut. E Penteadura gramado campo futebol | **5 dias** | **Seg 16/07/18** | **Sex 20/07/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 14 | Transferência salão cabeleireiro | **75 dias** | **Seg 29/01/18** | **Sex 11/05/18** | **100%** | **ENTREGUE NO PRAZO** |
| 15 | Novo mobiliário do salão de festas | **95 dias** | **Qui 05/04/18** | **Qua 15/08/18** | **100%** | ENTREGUE NO PRAZO |
| 16 | Reforma da pista de cross natural | **50 dias** | **Seg 11/06/18** | **Sex 17/08/18** | **100%** | ENTREGUE NO PRAZO |

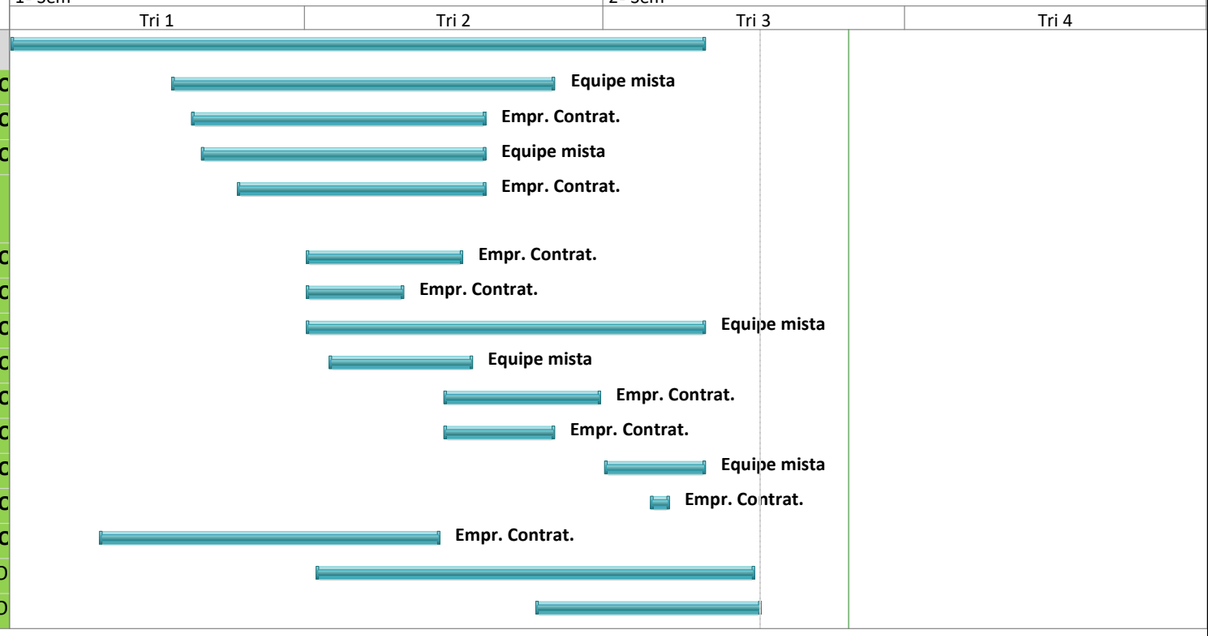


Projeto: CRONOGRAMA DE OBRAS
Data: Sex 14/09/18

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tarefa | | Resumo de Projecto | | Marco Inactivo | | Resumo da Agregação Manual | | Prazo | |
| Dividir | | Tarefas Externas | | Resumo Inactivo | | Resumo Manual | | Progresso | |
| Marco | | Marco Externo | | Tarefa Manual | | Apenas início | | Progresso manual | |
| Sumário | | Tarefa Inactiva | | Apenas-duração | | Apenas-conclusão | | | |
